
LPWiK S.A.
LEGNICA

Protokół inspekcji nr 01.00544
Armii Krajowej

ZLECENIE	Armii Krajowej
Miejscowość	Legncia
Ulica	**Armii Krajowej**
Data inspekcji	08-06-2018
Rok budowy	1995

ODCINEK	
Numer	1006S02A 1006S01A
Rodzaj kanału	Sanitarna
Materiał	Kamionka
Średnica	300 x 300 mm
Długość odcinka	44.200
Długość inspekcji	44.350
Śr. spadek zmierzony	-0.090
Kierunek pom.	ze spadkiem

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	1006S02A	1006S01A
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica	1200	1200
Uwagi	Górna	Dolna

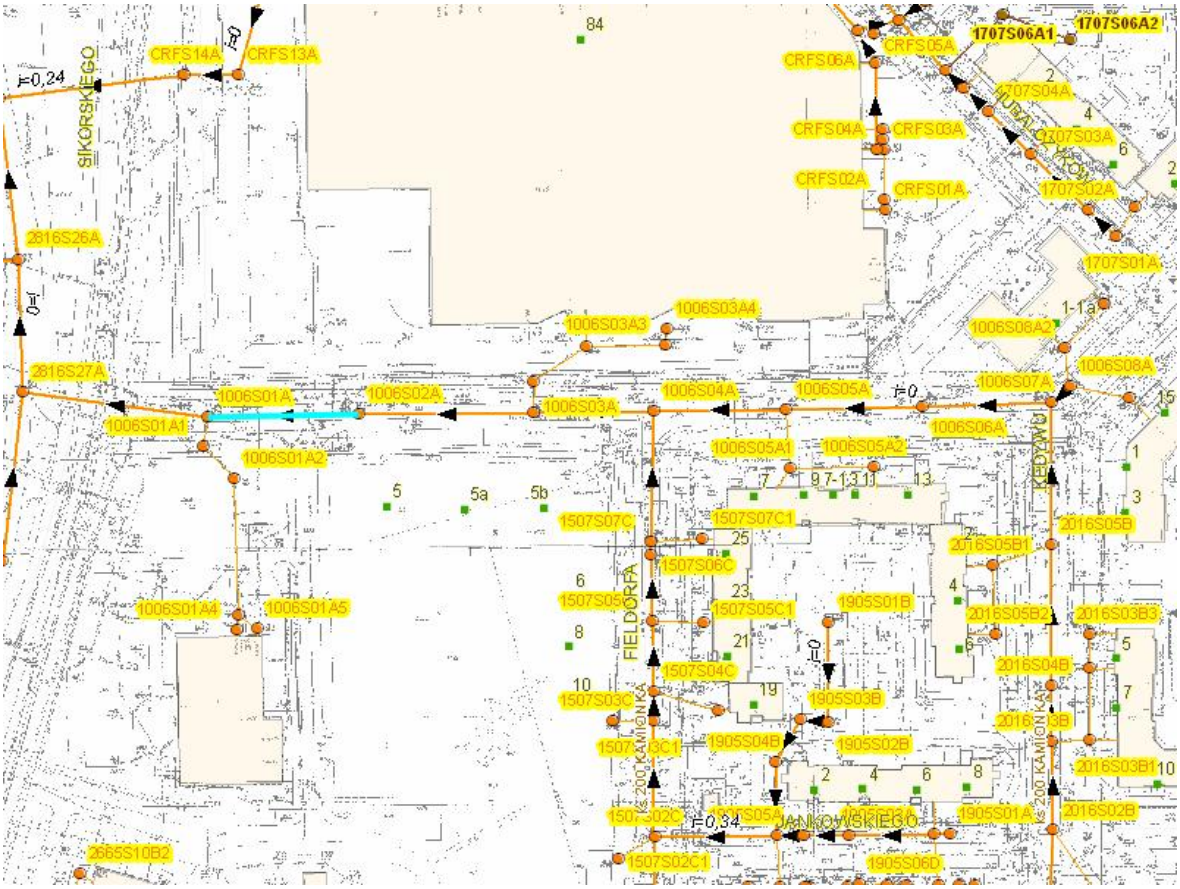

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	CDA-	Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa	1006S02A
2	4.43	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
3	5.54	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	2mm
4	6.21	AIZ-	Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające	
5	6.31	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	2mm
6	7.49	AIZ-	Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające	
7	10.70	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	2mm
8	11.57	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
9	13.57	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	3mm
10	14.88	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	3mm
11	17.85	AIZ-	Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające	
12	18.72	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	3mm

13	19.71			
14	20.62	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
15	22.47	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
16	23.96	AIZ-	Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające	
17	24.19	ABAA	Szczelina, zarysowanie, wzdłużna	2mm
18	25.15	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	2mm
19	26.44	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	2mm
20	26.80	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	4mm
21	28.21	AIZ-	Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające	
22	29.80	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
23	31.33	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	2mm
24	32.72	AIZ-	Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające	
25	35.85	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	2mm
26	37.28	AIZ-	Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające	
27	38.61	ABAB	Szczelina, zarysowanie, obwodowe	2mm
28	39.80	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	4mm
29	40.36	AIZ-	Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające	
30	40.58	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	2mm
31	41.64	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	3mm
32	42.88	DA--	Zdjęcia ogólne	
33	44.35	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	do biedronki
34	44.35	CEA-	Węzeł końcowy, studzienka włazowa	1006S01A


Zdjęcia z inspekcji



(1) 0.00 m - CDA- - Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa 1006S02A




(2) 4.43 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne

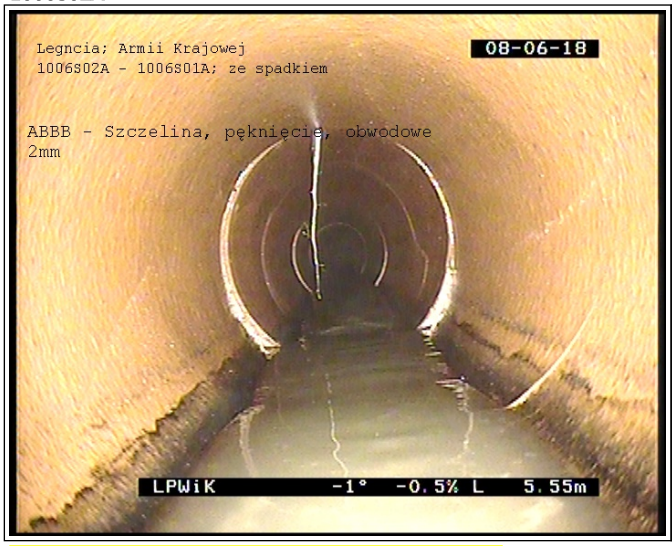

(3) 5.54 m - ABBB - Szczelina, pęknięcie, obwodowe 2mm




(4) 6.21 m - AIZ- - Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające

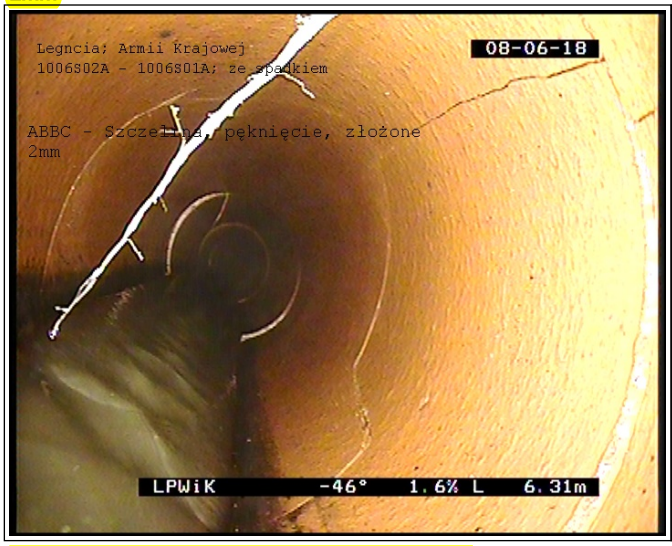

(5) 6.31 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 2mm



(6) 7.49 m - AIZ- - Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające

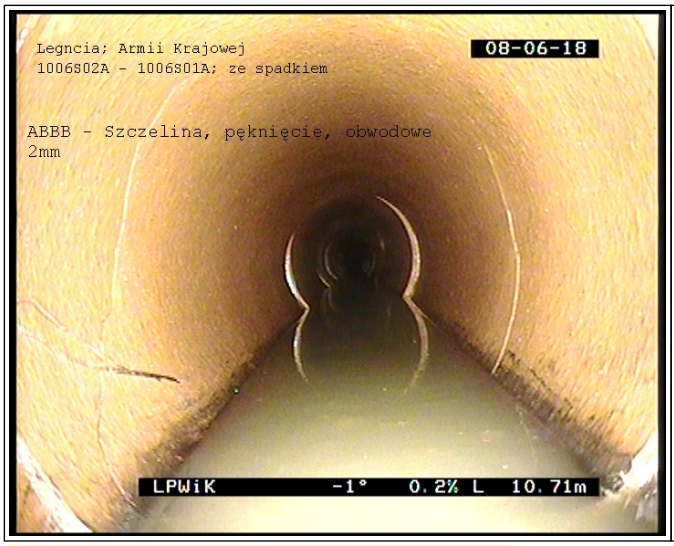

(7) 10.70 m - ABBB - Szczelina, pęknięcie, obwodowe 2mm



(8) 11.57 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne




(9) 13.57 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 3mm



(10) 14.88 m - ABBB - Szczelina, pęknięcie, obwodowe 3mm




(11) 17.85 m - AIZ- - Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające

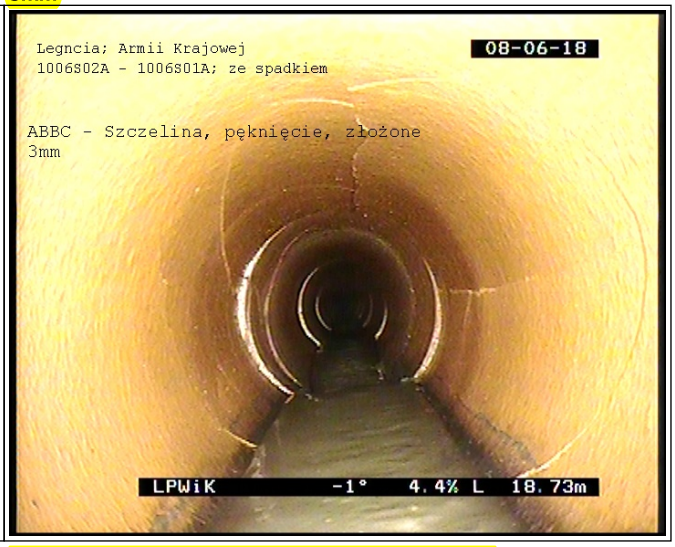

(12) 18.72 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 3mm



(13) 20.62 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne

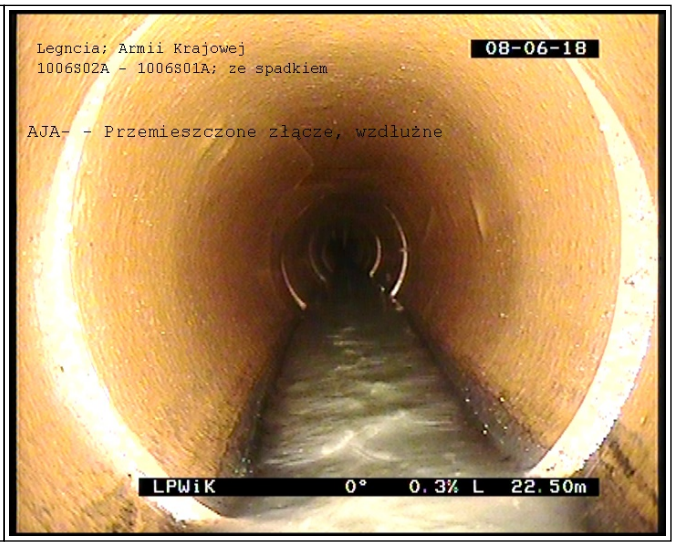

(14) 22.47 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne



(15) 23.96 m - AIZ- - Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające



(16) 24.19 m - ABAA - Szczelina, zarysowanie, wzdłużna 2mm




(17) 25.15 m - ABBB - Szczelina, pęknięcie, obwodowe 2mm



(18) 26.44 m - ABBB - Szczelina, pęknięcie, obwodowe 2mm



(19) 26.80 m - ABBB - Szczelina, pęknięcie, obwodowe 4mm

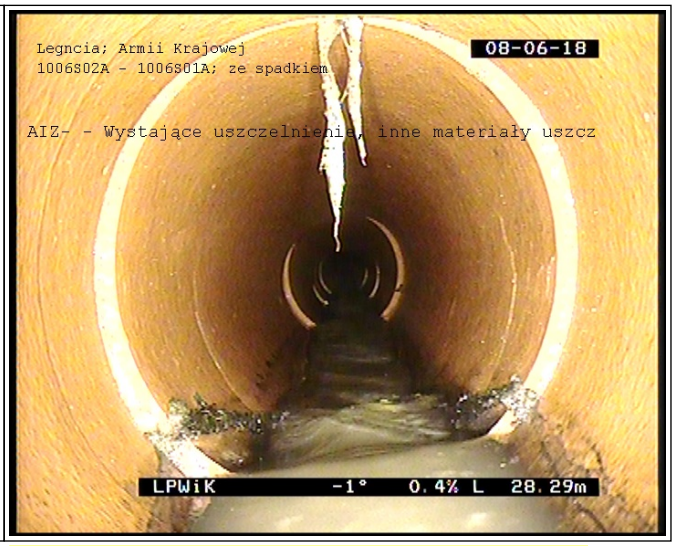

(20) 28.21 m - AIZ- - Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające



(21) 29.80 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne



(22) 31.33 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna 2mm



(23) 32.72 m - AIZ- - Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające



(24) 35.85 m - ABBB - Szczelina, pęknięcie, obwodowe 2mm



(25) 37.28 m - AIZ- - Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające



(26) 38.61 m - ABAB - Szczelina, zarysowanie, obwodowe 2mm



(27) 39.80 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 4mm



(28) 40.36 m - AIZ- - Wystające uszczelnienie, inne materiały uszczelniające



(29) 40.58 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 2mm




(30) 41.64 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 3mm



(31) 42.88 m - DA-- - Zdjęcia ogólne




(32) 44.35 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte do biedronki

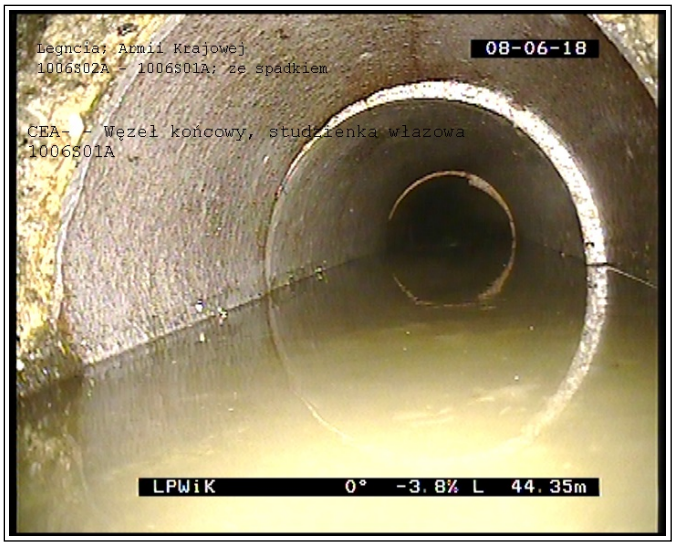

(33) 44.35 m - CEA- - Węzeł końcowy, studzienka włazowa 1006S01A

Wykres spadku kanału

Średni spadek zmierzony: -0.09 % (-0.94 ‰)
Pomiar od studni 1006S02A do studni 1006S01A

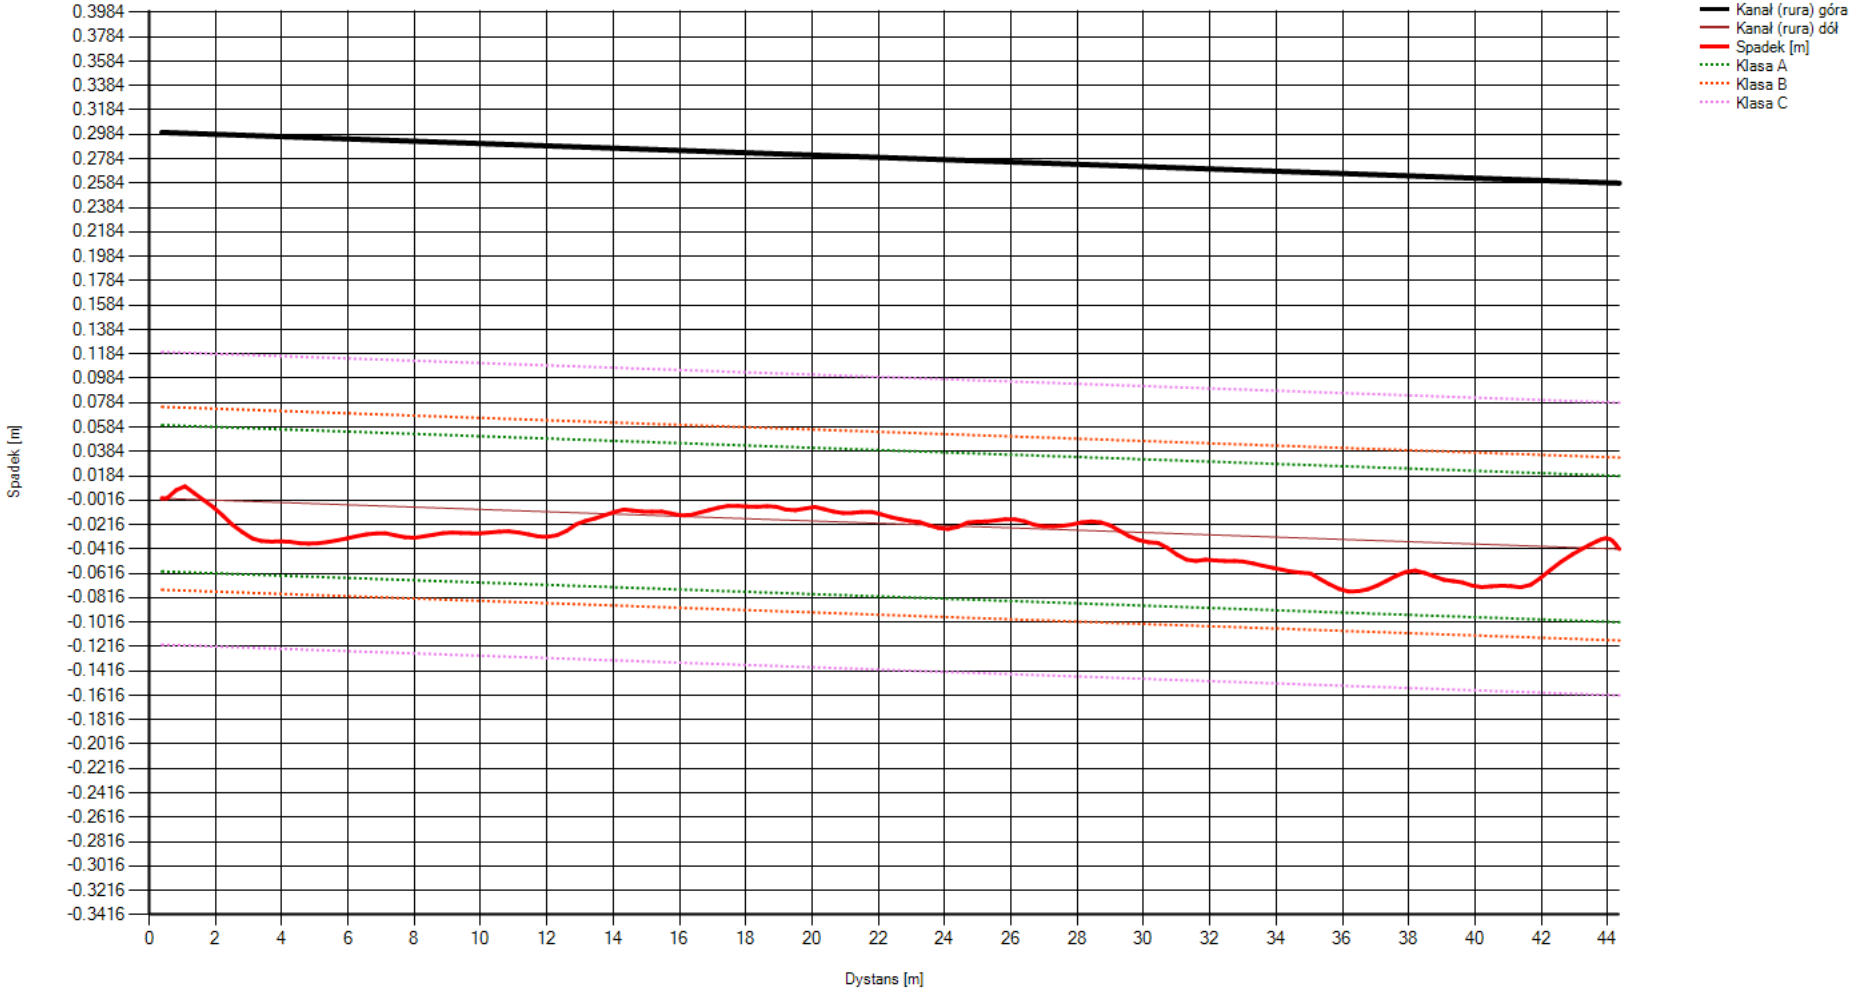

Schemat kanału

Pomiar od studni 1006S02A do studni 1006S01A

