
LPWiK S.A.
LEGNICA

Protokół inspekcji nr 01.00555
Piłsudskiego

ZLECENIE	Piłsudskiego
Miejscowość	LEGNICA
Ulica	**Piłsudskiego**
Data inspekcji	16-06-2018
Rok budowy	

ODCINEK	
Numer	2622S02C 2622S03C
Rodzaj kanału	Sanitarna
Materiał	Kamionka
Średnica	300 x 300 mm
Długość odcinka	41.000
Długość inspekcji	40.080
Śr. spadek zmierzony	0.810
Kierunek pom.	pod spadek

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	2622S03C	2622S02C
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica	1200	1200
Uwagi	Dolna	Górna

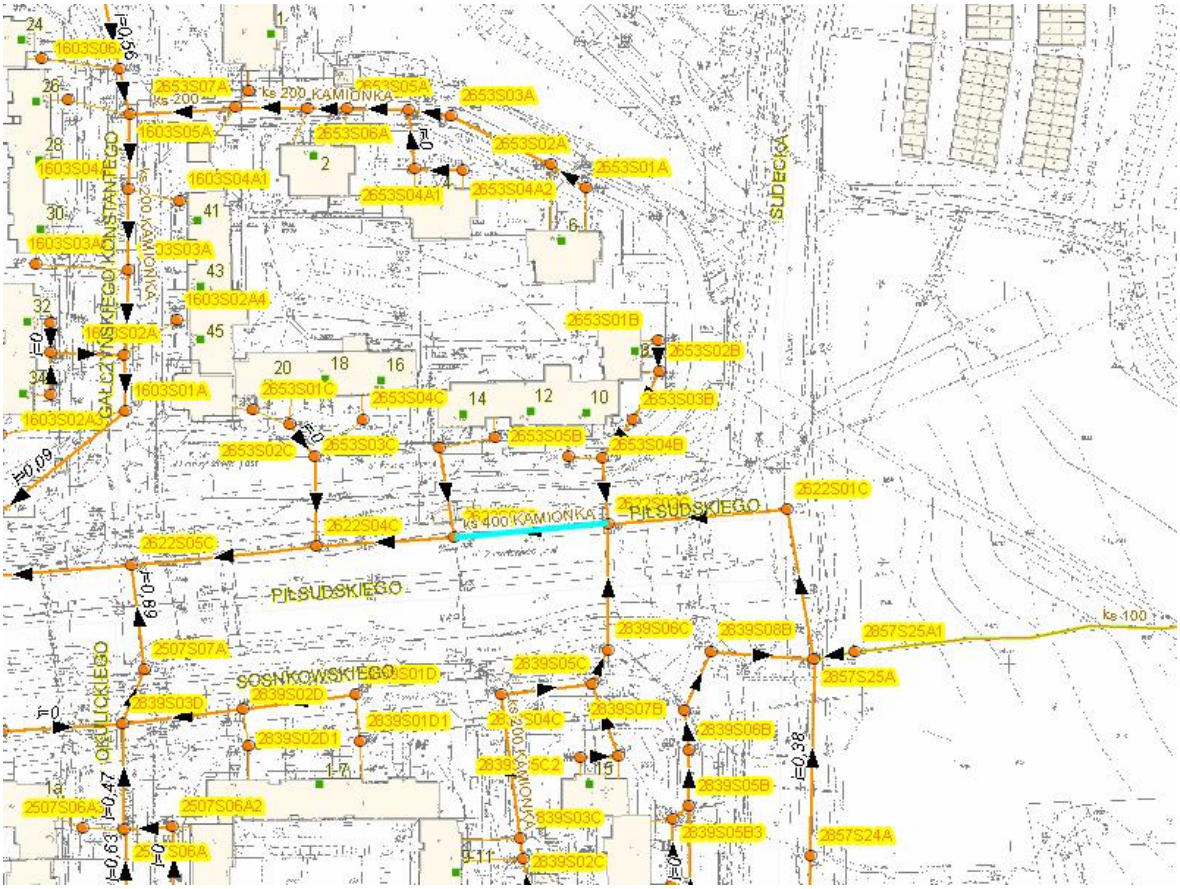

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.60	CDA-	Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa	2622S03C
2	0.60	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	8mm
3	1.01	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	10mm
4	2.56	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	5mm
5	3.92	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	5mm
6	4.75	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	5mm
7	5.78	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	5mm
8	6.78	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	5mm
9	7.73	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	8mm
10	8.67	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	10mm
11	9.86	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	5mm
12	16.05	DA--	Zdjęcia ogólne	

13	21.98	DA--	Zdjęcia ogólne	
14	26.34	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	3mm
15	32.17	DA--	Zdjęcia ogólne	
16	36.29	DA--	Zdjęcia ogólne	
17	38.55	DA--	Zdjęcia ogólne	
18	40.08	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	ul. Pruszyńskiego
19	40.08	CEA-	Węzeł końcowy, studzienka włazowa	2622S02C


Zdjęcia z inspekcji



(1) 0.60 m - CDA- - Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa 2622S03C



(2) 0.60 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 8mm

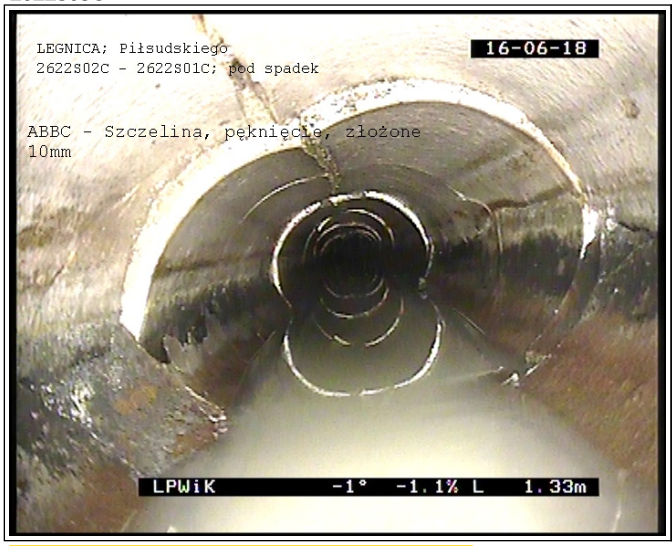

(3) 1.01 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 10mm




(4) 2.56 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 5mm




(5) 3.92 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 5mm



(6) 4.75 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 5mm

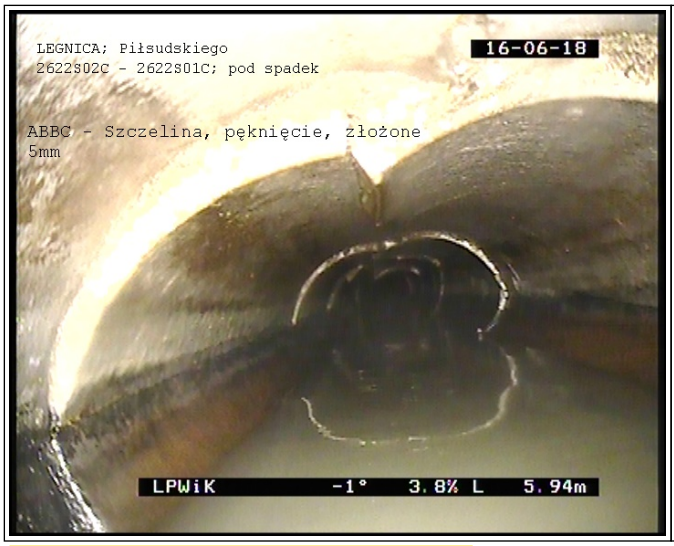


(7) 5.78 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 5mm

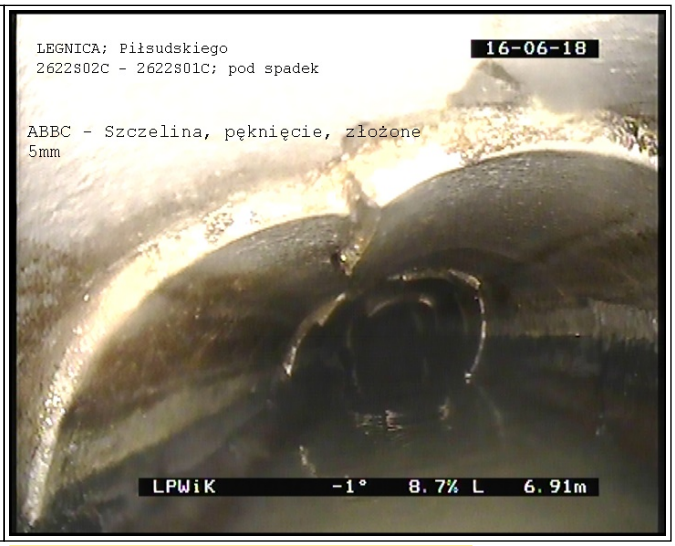

(8) 6.78 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 5mm



(9) 7.73 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 8mm

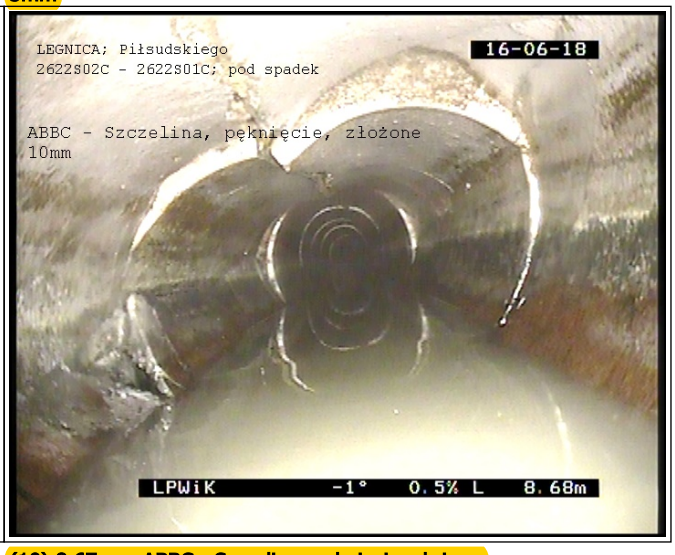

(10) 8.67 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 10mm




(11) 9.86 m - ABBB - Szczelina, pęknięcie, obwodowe 5mm




(12) 16.05 m - DA-- - Zdjęcia ogólne



(13) 21.98 m - DA-- - Zdjęcia ogólne

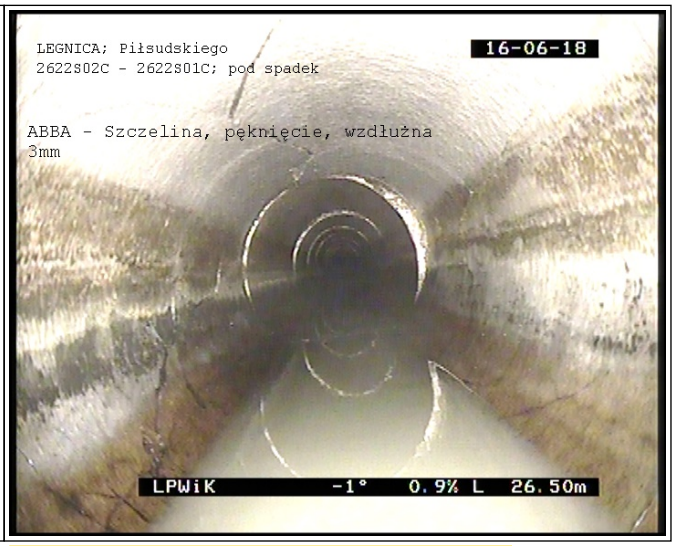

(14) 26.34 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna 3mm

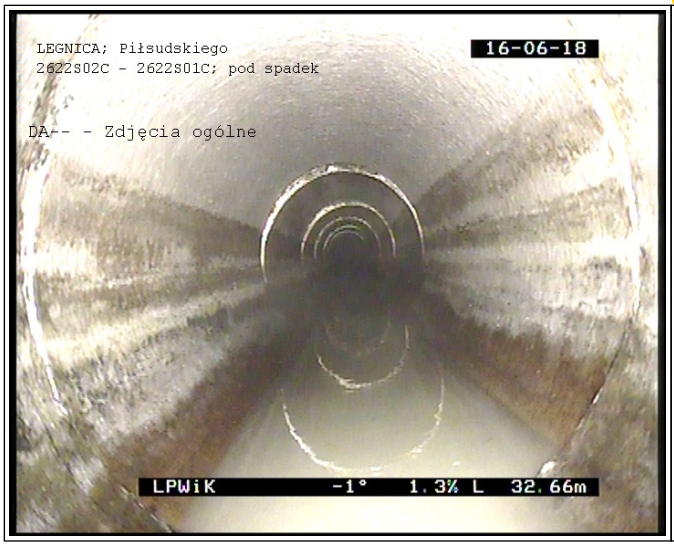

(15) 32.17 m - DA-- - Zdjęcia ogólne



(16) 36.29 m - DA-- - Zdjęcia ogólne



(17) 38.55 m - DA-- - Zdjęcia ogólne




(18) 40.08 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte ul. Pruszyńskiego



(19) 40.08 m - CEA- - Węzeł końcowy, studzienka włazowa 2622S02C

Wykres spadku kanału

Średni spadek zmierzony: 0.81 % (8.14 ‰)
Pomiar od studni 2622S03C do studni 2622S02C

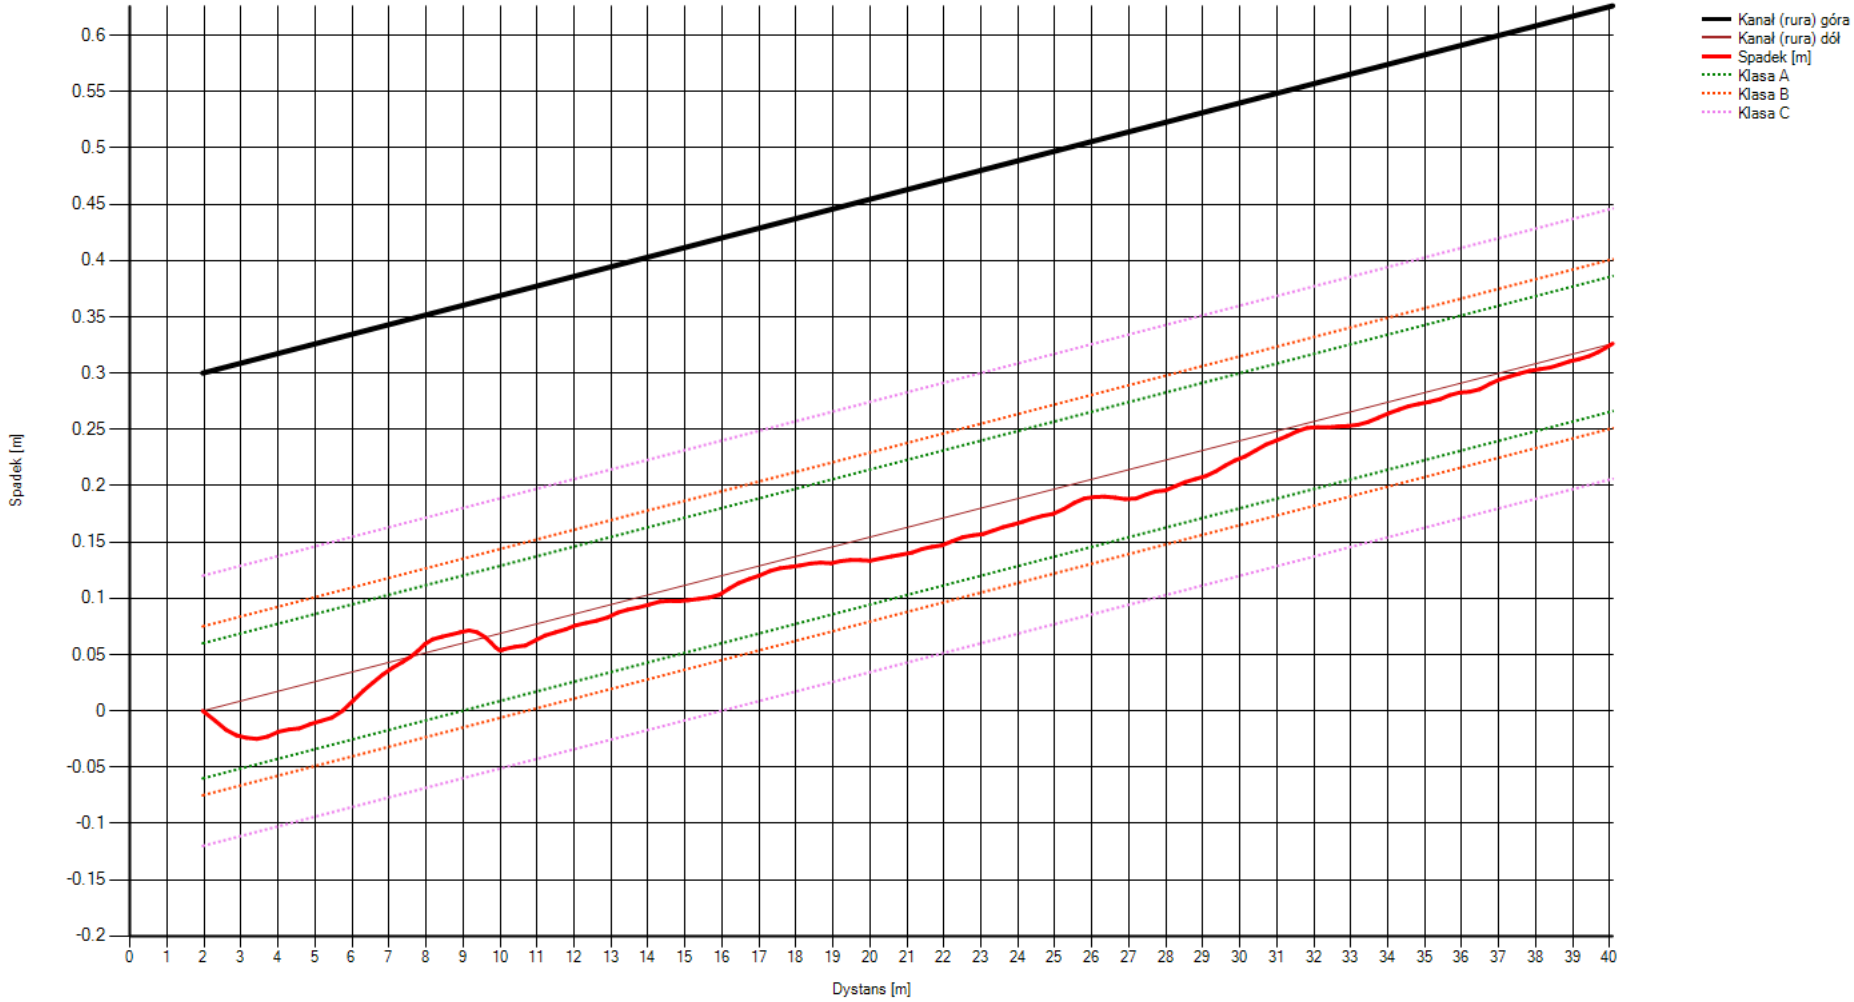

Schemat kanału

Pomiar od studni 2622S03C do studni 2622S02C

