LPWiK S.A.
LEGNICA


Protokół inspekcji nr 01.00769

Gwarna

ZLECENIE	Gwarna
Miejscowość	Leegnica
Ulica	**Gwarna**
Data inspekcji	18-08-2018
Rok budowy	1897

ODCINEK	
Numer	3136W01A 1626W01A
Rodzaj kanału	Ogólnospławna
Materiał	Kamionka
Średnica	600 x 600 mm
Długość odcinka	
Długość inspekcji	25.660
Śr. spadek zmierzony	0.580
Kierunek pom.	ze spadkiem


STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	3136W01A	1626W01A
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica	1200	1200
Uwagi	górna	dolna

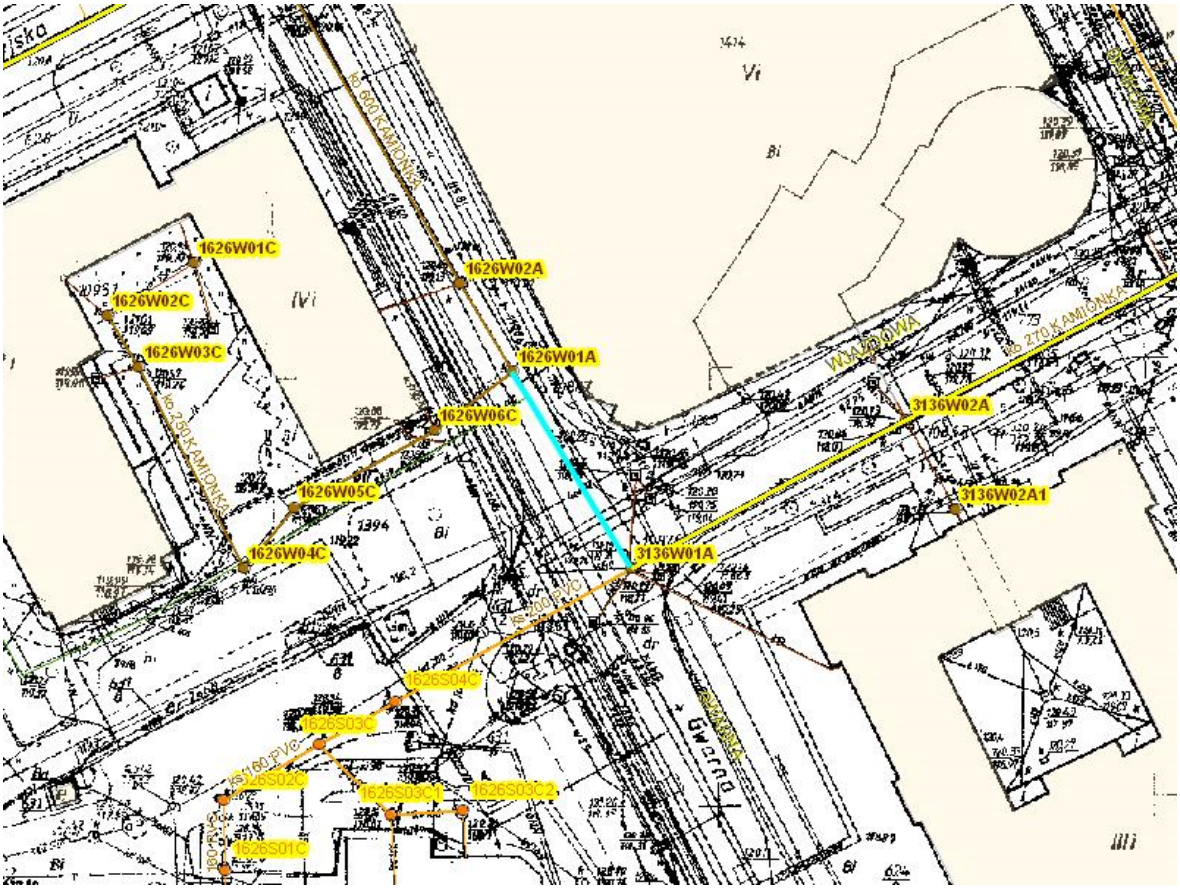

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	CDA-	Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa	3136W01A
2	1.80	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
3	3.90	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
4	6.61	DA--	Zdjęcia ogólne	
5	7.78	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	
6	8.41	DA--	Zdjęcia ogólne	
7	8.81	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	
8	8.81	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
9	11.08	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
10	13.00	DA--	Zdjęcia ogólne	
11	14.06	CAAB	Połączenie, łącznik, przyłącze zamknięte	
12	15.06	DA--	Zdjęcia ogólne	

13	19.48	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
14	21.64	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
15	21.86	DA--	Zdjęcia ogólne	
16	22.56	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	do studni 1626W06C
17	22.56	DA--	Zdjęcia ogólne	
18	23.33	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	
19	25.66	CEA-	Węzeł końcowy, studzienka włazowa	1626W01A

Zdjęcia z inspekcji

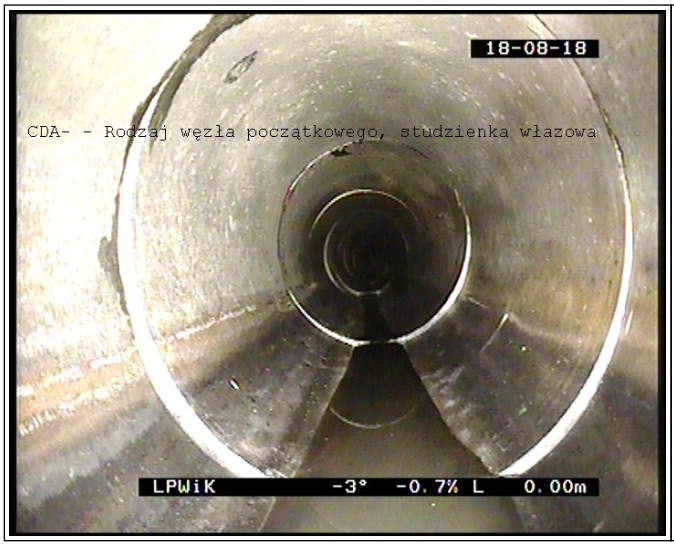


(1) 0.00 m - CDA- - Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa 3136W01A



(2) 1.80 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna




(3) 3.90 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna

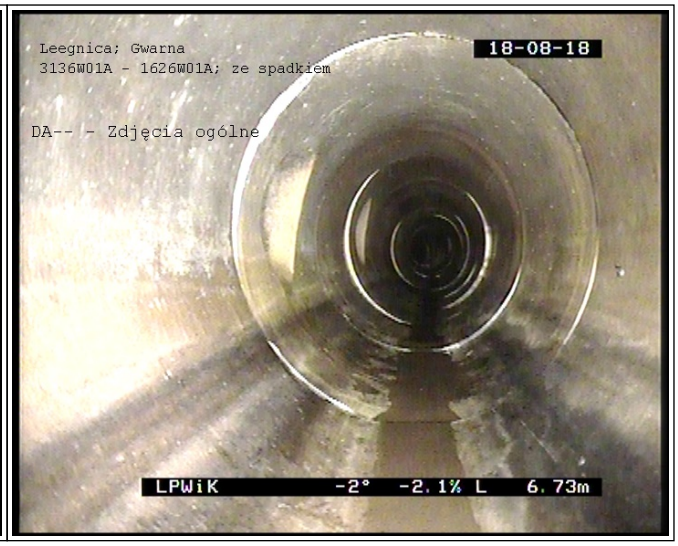

(4) 6.61 m - DA-- - Zdjęcia ogólne




(5) 7.78 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte

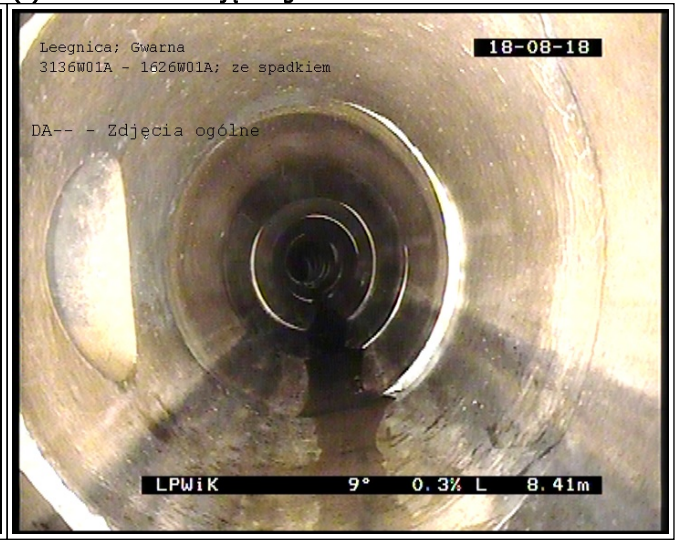


(6) 8.41 m - DA-- - Zdjęcia ogólne




(7) 8.81 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte

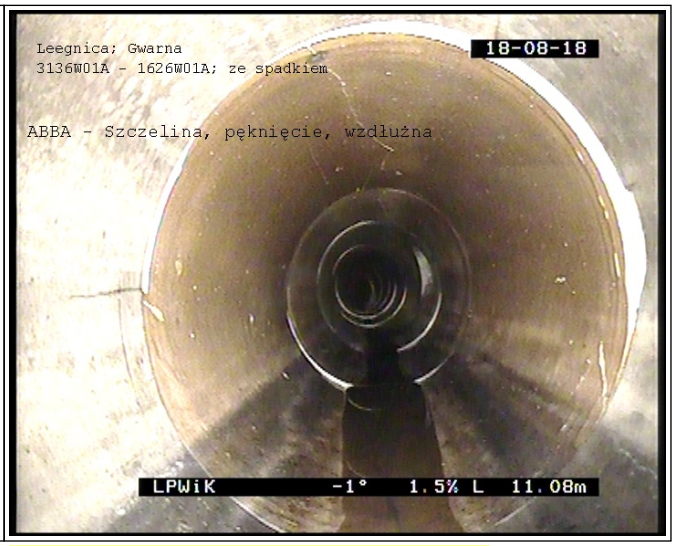

(8) 8.81 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna

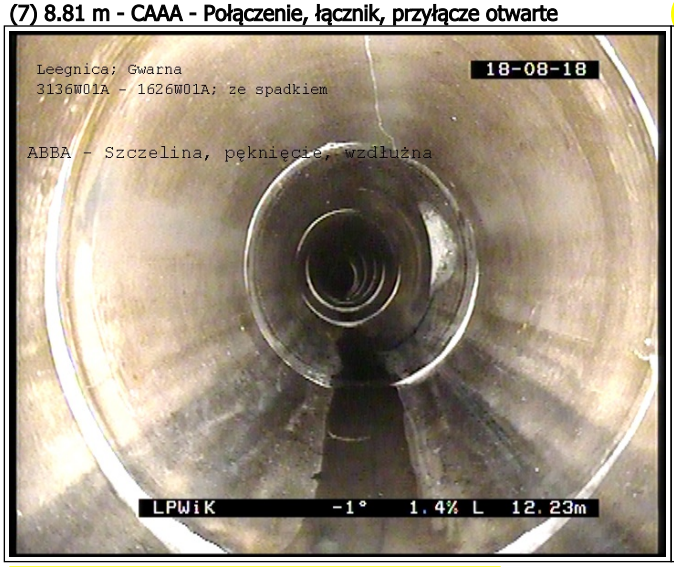


(9) 11.08 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna

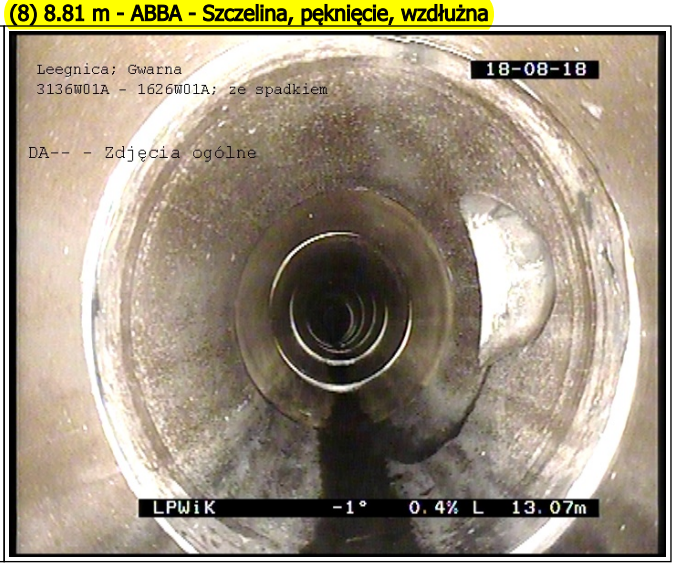


(10) 13.00 m - DA-- - Zdjęcia ogólne




(11) 14.06 m - CAAB - Połączenie, łącznik, przyłącze zamknięte

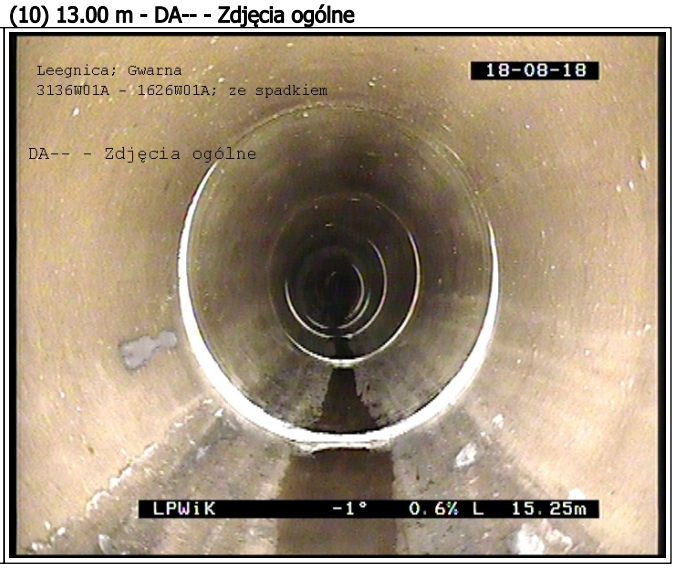

(12) 15.06 m - DA-- - Zdjęcia ogólne

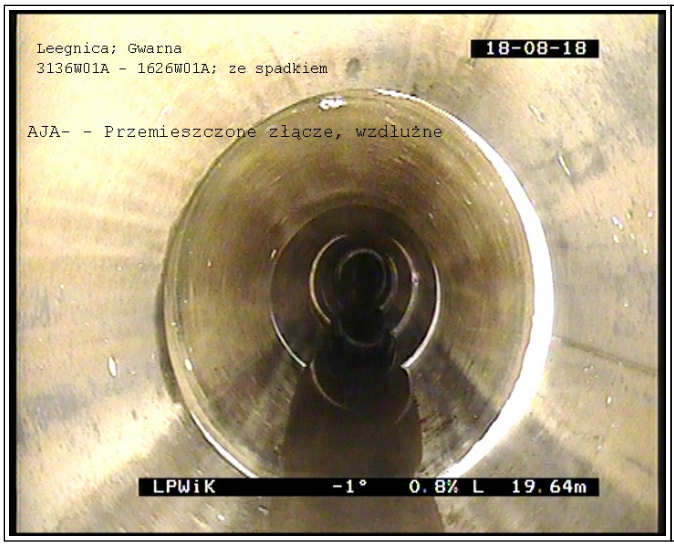

(13) 19.48 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne

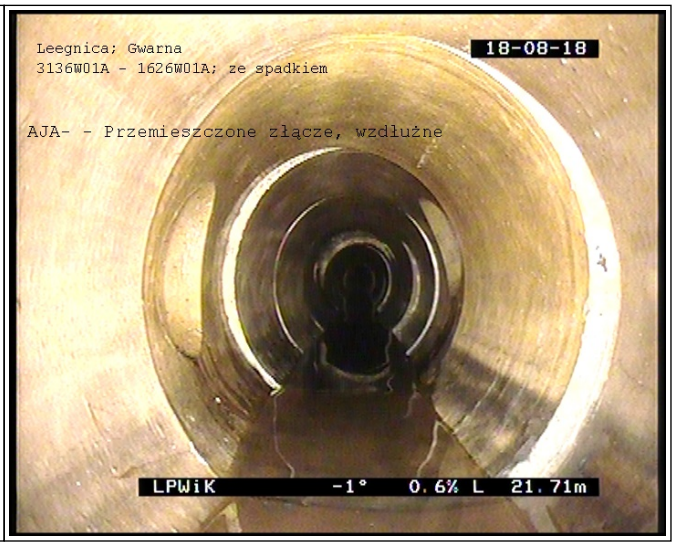


(14) 21.64 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne




(15) 21.86 m - DA-- - Zdjęcia ogólne



(16) 22.56 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte do studni 1626W06C

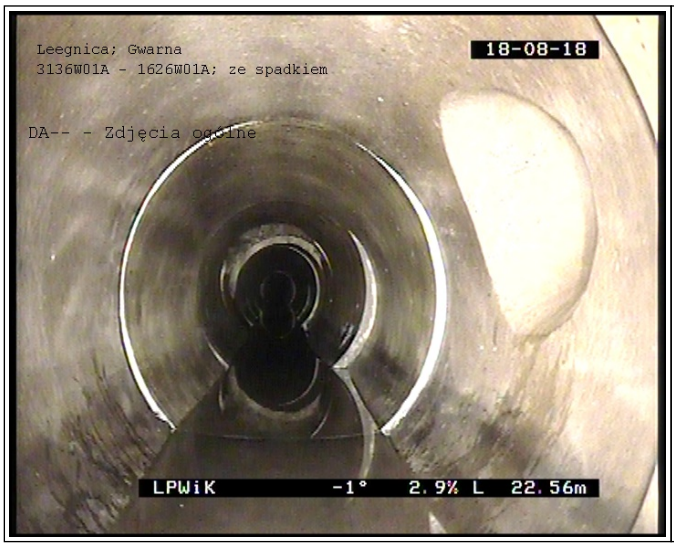

(17) 22.56 m - DA-- - Zdjęcia ogólne

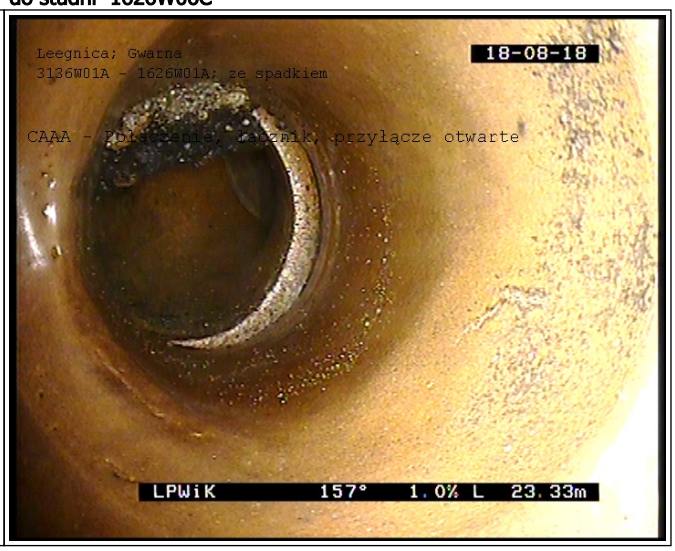


(18) 23.33 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte



(19) 25.66 m - CEA- - Węzeł końcowy, studzienka włazowa 1626W01A

Wykres spadku kanału

Średni spadek zmierzony: 0.58 % (5.84 ‰)
Pomiar od studni 3136W01A do studni 1626W01A

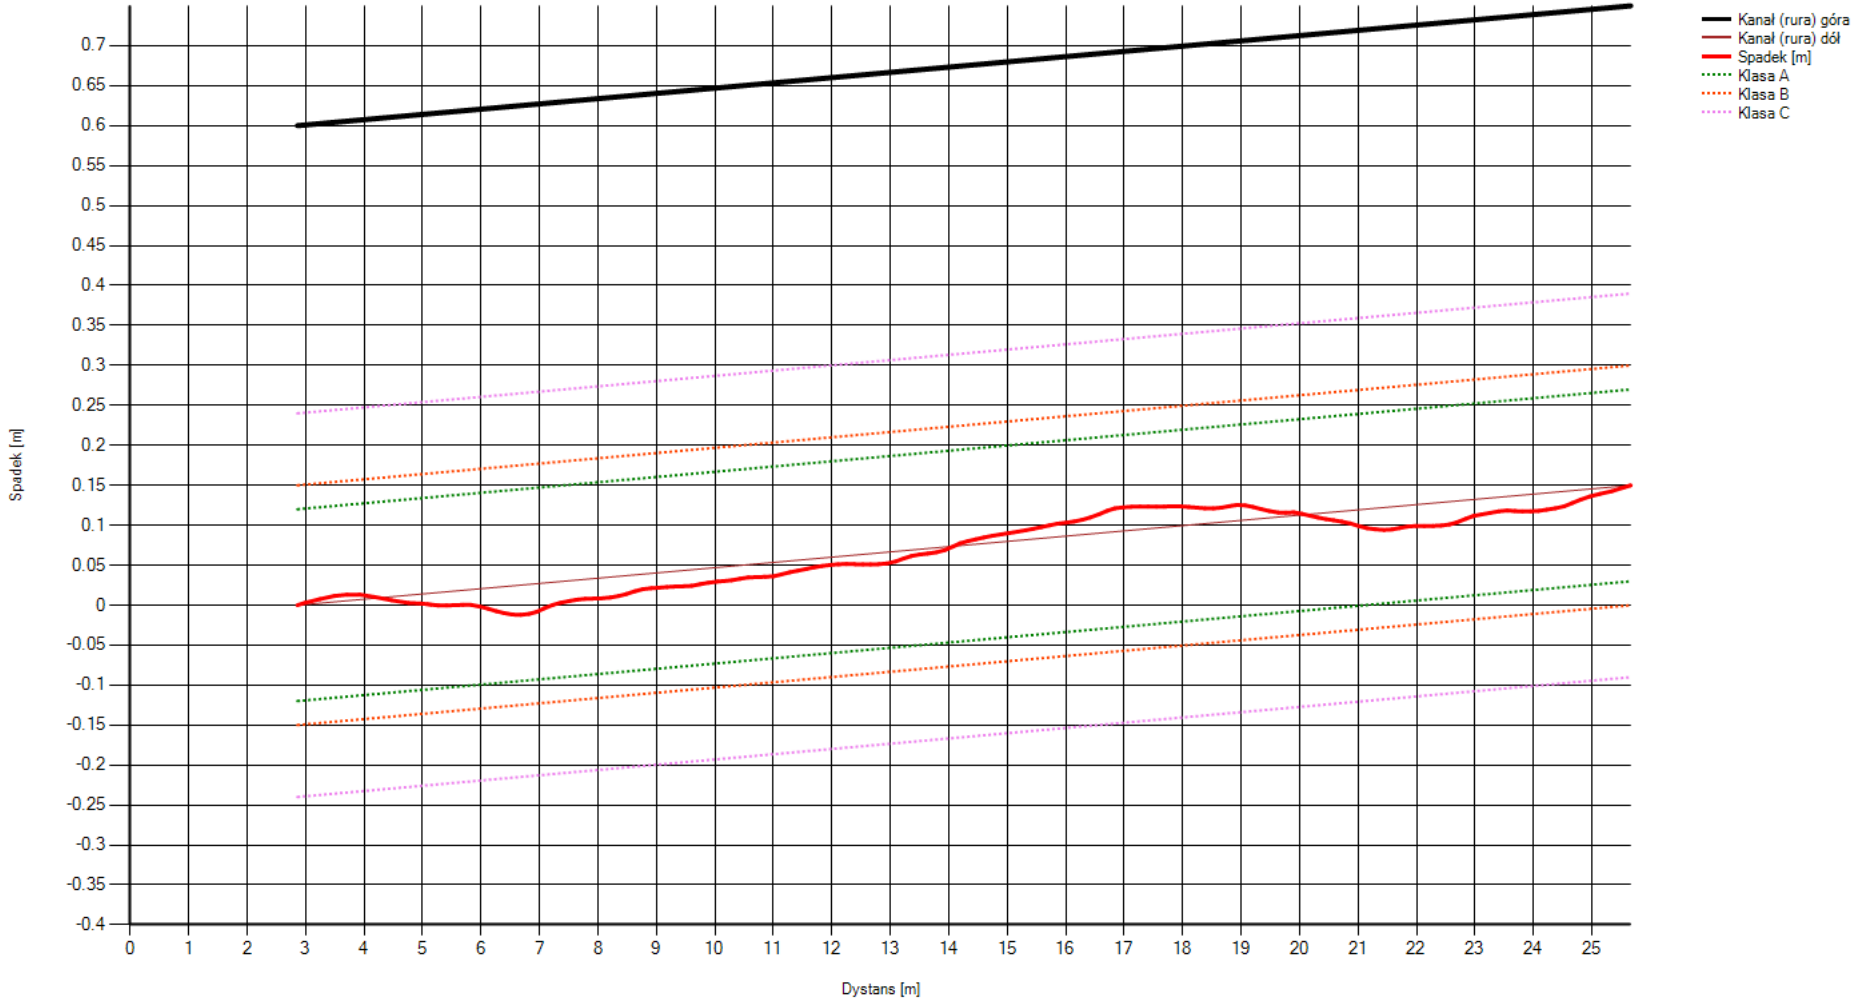

Schemat kanału

Pomiar od studni 3136W01A do studni 1626W01A

